

政 务 督 查

〔2018〕第 13 期

威海市人民政府办公室

2018 年 9 月 4 日

关于 2018 年市政府 为民办实事工作专项督查 情况的报告

为扎实做好 2018 年市政府为民办实事工作，根据年度工作安排，8 月 22 日至 23 日，市政府督查室会同有关部门单位，对市区范围内的为民办实事项目办理情况进行了专项督查，摸清了当前进展情况，查找出一些问题和制约因素，并有针对性地提出了整改思路，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

此次专项督查，共组成 3 个督查小组，集中利用 2 天时间，分头对市区（含环翠区、高区、经区、临港区，下同）内的为民办实事项目进行了全覆盖式的现场检查。一是在

督查形式上，采取不打招呼、直奔现场的方式进行，对照项目清单和工作台账，逐个项目看工程进展、看形象进度、看实施效果，逐一核实并拍照留存，力求掌握鲜活翔实的第一手资料。二是在督查安排上，计划分两个阶段进行：第一阶段，现场检查市区范围内 165 个点位，目前已完成。第二阶段，结合将于下步将要开展的专项督查活动，对文登区、荣成市、乳山市、南海新区的 238 个点位进行现场检查。其中，农村改厕、农村饮水安全巩固提升工程、家庭医生签约服务等现场点位较多的项目，采取随机抽查方式进行。从此次在市区督查的情况看，今年安排的 12 件为民办实事项目，11 件已经启动，部分已经建成并发挥积极作用，另有 1 件未按计划启动建设（改造农村供暖设施 281 处）。

（一）新建改扩建中小学、普惠性幼儿园方面：全市年内计划建设中小学 26 所、普惠性幼儿园 17 所，此次督查了位于市区内的 10 所中小学、8 所普惠性幼儿园。目前，已开工建设中小学 7 所，其中主体完工 5 所（环翠区望海园中学、古寨小学，高区第二中学、第三小学，经区曲阜学校中学部），在建 2 所（高区第四小学、经区凤林学校中学部）；3 所尚未开工（环



环翠区望海园中学



经区九龙湾幼儿园

翠区爱山实验学校、明湖路学校、福泰中学)为跨年项目,计划于9至10月份陆续开工建设,预计2019年建成。已开工建设普惠性幼儿园7所,其中建成并投入使用2所(环翠区哈佛摇篮幼儿园、大耳朵幼儿园),主体完工4所(环翠区东骏阅山幼儿园、张村中心幼儿园、明辰幼儿园,经区九龙湾幼儿园),在建1所(高区高新教育幼儿园);1所未按计划开工(环翠区环发幼儿园改造工程),计划于9月开工建设,预计年底具备使用条件。

(二)推行家庭医生签约服务方面:全市年内城乡居民家庭医生签约率分别达到30%和65%以上。考虑到此项工作点多面广,此次督查主要从城市和农村两个



孙家疃家庭医生团队联络图

羊亭中心卫生院

层面,选取孙家疃社区卫生服务中心、羊亭中心卫生院等2处提供家庭医生签约服务的基层医疗卫生机构进行了抽查。其中,孙家疃社区卫生服务中心共组建家庭医生服务团队5支,服务城镇居民18823人,目前已签约5665人(1.0版4121人,2.0版1534人),签约率30.1%(计划目标30%)。羊亭中心卫生院共组建家庭医生服务团队10支,服务农村居民30244万人,目前已签约19659人(1.0版15878人,2.0版3781人),签约率65%(计划目标65%)。目前,全市家庭医生签约服务100万人,其中城市25.17万人,签约率24.51%;农村74.82万人,签约率46.68%。

(三)实施瓶颈路打通工程,治理“背街小巷”方面:全市年内计划实施7条瓶颈路打通工程、治理“背街小巷”20处,此次督查了位于市区内的7条瓶颈路打通工程、14处“背街小巷”治理工程。目前,7条瓶颈路打通工程已全部开工,其中望岛河南路项目已完工。11处“背街小巷”治理工程已开工建设,其中完工9处(火炬三街、火炬四街、火炬八街、峰北路西侧小巷、皇冠西路、和盛巷、蒿泊大街农业银行西胡同、凤林路北、东海路无名路),在建2处(苏州街背街小巷、菊花顶路背街小巷);3处尚未开工(高区德州中街、万家疃村委东侧道路,经区青岛路背街小巷),计划9月份开工,9月至11月陆续完工。



环翠区望岛河南路



高区火炬四街



环翠区羊亭河

条,此次督查了位于市区内的11条河道。目前,已开工整治8条,其中完工5条(环翠区望岛河、高区长乔河、经区石家河、临港区山马河、东母猪河),正在整治3条(环翠区羊亭河完成96%、北上乔河完

成 69%、经区五渚河完成 98%); 3 条尚未开工 (高区钦村河、涝台河、经区九龙河), 正在制定河道规划方案。

(五) 建设小游园、山体公园, 新增城市绿道方面: 全市年内计划建设小游园 23 处、山体公园 5 处、城市绿道 48.8 公里, 均位于市区内。目前, 23 处小游园均已开工建设, 其中已完工 19 处 (环翠区景湖公园等 3 处、高区官松岭路小游园等 4 处、经区站前广场游园等 4 处、临港区创新经济产业



高区后峰西游园



环翠区张村南山公园

园游园等 8 处), 在建 4 处 (望岛河小游园、海峰游园、后峰西游园、南大疃游园)。5 处山体公园中南山公园已完工; 其余 4 处 (笔架山公园、曲阜公园、摩天岭公园、金线顶公园) 为跨年工程, 正在进行立

项报批、方案设计等前期准备工作, 笔架山山体公园计划 10 月开工建设, 曲阜山体公园和摩天岭山体公园计划 2019 年 3 月开工, 金线顶公园计划 2019 年 5 月开工。计划新增 18 条、48.8 公里城市绿道, 目前, 已开工 14 条、41.24 公里 (东部滨海新城金鸡大道、北一路、北二路、泊高线、逍遥路、松涧路、渠涯路、海悦路、寨北路、磐鼎路、逍遥社区周边路, 临港区 202 省道、嘉和路、鸿福路), 其余 4 条 7.56 公里 (经区鸣翠山绿道, 东部

滨海新城湖西路、湖东路、经五路)尚未开工。

(六) 改造提升中心城区公共厕所、农村改厕方面: 全市年内计划改造提升中心城区公共厕所 25 处、农村改厕 11.3 万户, 此次督查了位于市区内的 23 处公共



临港区 202 省道绿道



高区劳动力市场中心公厕

厕所。目前, 公共厕所完工 10 处(高区海水浴场 1 至 4 号公厕、林海公园 1 号至 5 号公厕、劳动力市场中心公厕), 在建 8 处(环翠区市政府广场公厕、樱花园公厕、五文化公厕、市立医院和平路公厕、新威路公厕, 高区帝王宫公厕, 临港滨河湿地 A 户、C 户), 5 处尚未开工(经区

九龙河公厕, 高区西河北公厕、山大路公厕、西北山公厕、9 路终点站公厕), 计划 9 至 10 月份开工, 10 至 12 月份陆续完工。

(七) 中心城区开通优化公交线路, 提高换乘便利性方面: 市区年内计划开通优化 7 条公交线路。目前, 已优化调整了公交线路 8 条(25、28、103、106、113、115、117、K7), 增设了 2 条(10



25 路、K7 路公交车延伸至威高花园始发

路黄岛路支线、节假日广福寺公交旅游专线)。

(八) 利用老建筑建设城市博物馆等公益文化空间,丰富群众文化体验方面:9处公益文化空间(含1处备选空间)均位于市区。目前,已全部开工建设(京剧博物馆、佳润美术馆、吉呈轩民间技艺馆、威海非遗文化空



海依达丝绵画艺术馆内部

间、寿山石文化博物馆、海依达斯丝绵画艺术馆、富城乡情民俗馆、中国国家画院周韶华艺术研究所、刘公岛艺术空间)。待全部完工后,将择优评选8处公益文化空间予以授牌。

(九) 新建社区居家养老服务组织,打造15分钟社区养老服务圈方面:全市年内计划新建社区居家养老服务组织72个,此次督查了位于市区内的20个居家养老服务组织。



文笔峰老年公寓居家养老服务部

目前,已投入运营19个(环翠区文笔峰老年公寓居家养老服务部等7个、高区亲情园社区养老服务中心等3个、经区爱家无忧社区养老服务中心等6个、临港区上诚健康养老服务中心等3个);还有1个(环翠区祥福家戚东乔社区居家养老服务组织)将于9月投入运营。

(十) 实施农村饮水安全巩固提升工程,改善居民饮水条件

方面：全市年内计划在 252 个村实施农村饮水安全巩固提升工程，此次督查了位于市区内的 46 个村的实施情况。目前，23 个村的工程项目已开工，其中已完成 18 个村（环翠区张村镇东乔、福德庄、刘家疃、姜家疃，临港区汪疃镇王家产、前白鹿、白鹿店子、白鹿屯、北大英、东梁格、蔺山镇道北店、新权、小黄、杨家卧龙、北申格、东申格村，经区桥头镇信河北、北墩前），正在施工 5 个村（经区泊于镇夏庄、桥头镇姚家圈、教里、前宅库、碑鲁）；23 个村尚未开工，正在进行管路规划、工程选址等准备工作，年底前全部完成。



环翠区张村镇刘家疃村净水设备

（十一）新建农业社会化综合服务中心，为农户提供一站式、全链条服务方面：全市年内计划新建 31 处农业社会化综合服务中心，此次督查了位于市区内的 4 处建设情况。目前，已开工 2 处，其中已完成



经区农业社会化服务中心

1 处（桥头农业综合服务中心），主体完工 1 处（汪疃农业综合服务中心）；2 处尚未开工（羊亭镇、初村镇），计划 9 月份开工

建设，预计于 10 月份完工。

（十二）改造农村供暖设施 281 处，实现农村公共场所清洁供暖全覆盖方面。目前此项工作仍在做前期准备工作，尚未取得实质性进展。

二、督查中发现的问题

总的看，除个别项目进展迟缓外，大部分为民办实事项目正按年初计划安排平稳有序推进。但督查中也发现一些问题，特别是从项目计划进度和实际进度、预期目标和实际效果等方面对比看，有些问题还比较突出，需要引起高度关注，抓紧采取措施研究解决。具体来看，主要有以下三个方面问题。

（一）个别项目推进缓慢。①改造农村供暖设施工程未开工。②部分城市绿道推进较慢，4 条、7.56 公里绿道未开工。③绿化整治河道方面，3 条河道尚未开工，部分已完工的河道整治工程质量不高。

具体情况如下：一是改造农村供暖设施工程未开工。此项工作原计划 6 月份开工 50%以上，7 月份全面开工，由于前期论证时间比预期要长，至今尚未组织施工建设。二是部分城市绿道推进较慢，4 条、7.56 公里绿道未开工。已开工建设的城市绿道中，东部滨海新城泊高线、金鸡大道、北一路、北二路、寨北路等 5 条绿道因涉及征地、土方爆



湖西路绿道尚未动工

破、招投标等问题，年内完工压力较大；另有 4 条、7.56 公里绿道未开工，其中新城湖东路南延绿道、经五路绿道计划 9 月开工、12 月完工；新城湖西路绿道贯穿国际经贸交流中心场区，需待经贸中心主体完工后施工，计划 2019 年 3 月开工；经区鸣翠山绿道位于摩天岭公园内，需同摩天岭公园一同实施，计划 2019 年 3 月开工。三是绿化整治河道方面，3 条河道尚未开工，部分已完工的河道整治工程质量不高。市区年内计划绿化整治的

11 条河道中，钦村河、涝台河、九龙河等 3 条河道尚未开工，正在对河道规划方案进一步完善，补充景观绿化内容，计划分三年对市区 9 条河道（含望岛河、钦村河、涝台河、九龙河）实施综合整治，预计



长乔河河道杂草较多

2019 年开工。已完工的河道中，望岛河南土坡未进行绿化，高区长乔河河道杂草较多，环翠区北上乔河大桥南侧未绿化整治。

（二）部分项目建设标准不高，实施效果有待提升。①家庭医生签约服务 2.0 版签约人数较少，保障资金尚未落实到位。②部分城市公益文化空间场馆设置不够便民，有的存在安全隐患。③社区居家养老服务组织，存在人员不足、服务能力弱、服务标准不统一等问题。

具体情况如下：一是家庭医生签约服务 2.0 版签约人数较

少，保障资金尚未落实到位。在家庭医生签约服务人群中，2.0版签约人数占比较低(孙家疃社区卫生服务中心2.0版签约人数占签约总数的27%、羊亭中心卫生院占19%)，主要因为2.0版家庭医生签约服务费由医保基金、基本公共卫生服务经费和签约居民付费等分担，但目前卫生、人社部门尚未就医保基金负担部分达成一致，导致签约工作推进较慢。二是部分城市公益文化空间场馆设置不够便民，有的存在安全隐患。9处城市公益文化空间，大部分已陈列展品，但存在场馆标识不醒目、交通不便利、存在安全隐患等问题。



佳润美术馆位于旧厂区院内且无明显标识

佳润美术馆位于环翠区和平路152号旧厂区院内，门口设有挡车器，且没有指示标识，不便于寻找；富城乡情民俗馆位于经区富城广场地下一层（原为地下停车场），需步行至地下观展，该项目



汪疃镇敬老院难以提供居家服务

尚未完成消防验收、规划变更等手续，且现场只有2个出入口，存在一定安全隐患。三是社区居家养老服务组织，存在人员不足、服务能力弱、服务标准不统一等问题。

根据民政部门要求，城市居家养老服务组织，需为社区内有需求的居家老年人提供助餐、助浴、助

洁、助医等居家养老服务，服务辐射 2 个以上社区；农村居家养老服务组织，需为本村内低收入、高龄、独居、残疾、失能、失智、留守等特殊老年人提供助餐、护理、家政等居家养老服务。总的来看，城乡社区居家养老服务组织普遍存在人员不足、服务能力弱、标准不统一等问题，例如经区祥福家海峰路社区养老服务中心只有 2 名工作人员，每天只能为 3 至 4 名老人提供服务，难以辐射整个社区；高区均依托居委会建设，未实际开展服务；临港区汪疃、蔺山敬老院只有 10 余名护理人员，需为 100 多位常住老人提供服务，无暇再为周边老人提供居家服务。


（三）部分项目精细化程度不高，影响了整体效果。①部分中小学周边环境较乱、道路条件差。②个别公交线路调整后，未及时更新站牌。③部分农村饮水设施故障无法使用、卫生条件差。④个别背街小巷整治后路况依然较差。⑤部分小游园环境较差。

具体情况如下：一是部分中小学周边环境较乱、道路条件差。高区第二中学、第三小学正门出入道路较窄，周边居民区密集，投入使用后，容易造成道路拥堵。二是个别公交线路调整后，未及时更新站牌。28 路车由魏桥南区延伸至路东驾培基地，增设了 6 个站点，但均未对公交站牌进行及时更新，给群众出行造成不便。三是部分农村饮水设施故障无法使用、卫生条件差。环翠区张村镇刘家疃村、姜家疃



高区第三小学门口通道狭窄

村和临港区汪疇镇王家产村等 3 个村饮水设施不同程度存在故障问题，影响村民使用。临港区汪疇镇前白鹿村、蔺山镇新权村等 7 个村净水设备房存在堆放杂物、垃圾等现象，卫生条件较差。四是个别背街小巷整治不彻底，路况依然较差。经区峰

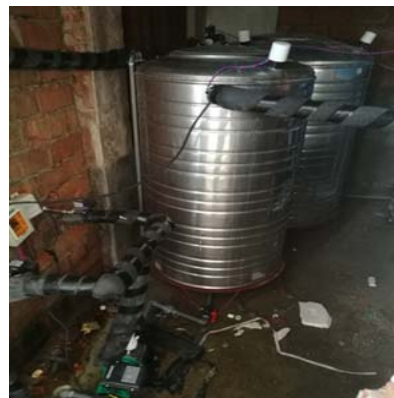

汪疇北大英村饮水设备房卫生差



皇冠西路人行道破损

北路西侧小巷、皇冠西路只对占道经营等问题进行了整治，路面未修整、人行道存在破损；蒿泊大街农业银行西胡同，只对破损路面进行了“打补丁”式修补，路况较差。五是部分小游园环境较差。

官松岭路小游园



临港区佳赛园小游园路面破损

三、下步对策措施

针对当前为民办实事项目办理中存在的突出问题，我们将坚持目标导向、问题导向，强化工作督导和措施落实，确保为民办实事项目落地见效，努力让群众有获得感和幸福感。

（一）坚持分类施策，进一步强化工作督导。对于推进缓慢的项目，将采取“一对一”的方式跟踪督办，及时制定解决方案；对于建设标准不高、实施效果较差的项目，要求责任单位切实提

出整改思路和措施，努力提升办理效果；对于精细化程度不高的项目，督促责任单位及时改进，推动工作扎实开展。

（二）强化责任落实，切实抓好问题整改。严格执行民生实事月调度制度，对督查中发现的问题紧盯不放，督促有关责任单位倒排工期、抓好整改，层层压实办理责任，确保责任落实到位。特别是针对此次督查中发现的问题，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化”要求，建立工作台账，实销号管理，督促部门明确整改目标，拿出整改方案，以钉钉子的精神推动整改工作落实落地。

（三）完善推进机制，促进各项工作有序开展。继续把为民办实事项目作为重点督查事项，实行挂牌督办，加强跟踪督查，确保件件有落实、事事有回音。对位于文登区、荣成市、乳山市、南海新区的剩余 238 个现场点位，将结合下步的专项督查活动，尽快进行现场督查，真正做到全方位、全覆盖，相关情况将及时呈领导审阅。

附：1. 市区范围内 2018 年市政府为民办实事工作专项督查情况

2. 2018 年 1—8 月为民办实事项目目标任务计划进度表

报送：市政府市长、副市长，秘书长、副秘书长，办公室副主任。

威海市人民政府办公室

2018 年 9 月 4 日印发

市区范围内 2018 年市政府为民办实事工作专项督查情况

(截至 2018 年 8 月 23 日)

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	进展情况
1	市区年内计划建设中小学 10 所、普惠性幼儿园 8 所	市教育局	区政府（管委会）	一、中小学建设情况： （一）主体完工 5 所。 1.环翠区古寨小学教学楼：主体建设已完工，9 月 3 日投入使用。 2.经区南曲阜学校：已完工，9 月 3 日投入使用。 3.环翠区望海园中学：主体建设已完工。 4.高区第三小学：主体建设已完工。 5.高区第二中学：主体建设已完工。 （二）正在建设 2 所。 6.经区凤林学校：主体建设已封顶，外围脚手架尚未拆除。 7.高区第四小学：已开工，正在进行主体建设。 （三）尚未开工 3 所。 8.环翠区福泰中学为跨年项目，计划 9 月进行施工图设计招标，10 月进行现场围挡搭建和土方施工，2019 年主体完工。 9.环翠区爱山实验学校为跨年项目，计划 9 月开工、12 月完成主体施工，2019 年 8 月建成投入使用。 10.环翠区明湖路学校为跨年项目，计划今年 10 月开工建设，2019 年 8 月小学部建成投入使用。 二、幼儿园建设情况： （一）投入使用 2 所。 1.环翠区大耳朵幼儿园：2017 年 12 月建成，2018 年 2 月开始招生。 2.环翠区哈佛摇篮幼儿园：2017 年建成，2018 年 3 月开始招生。 （二）具备使用条件 2 所。 3.经区九龙湾幼儿园：主体已完工，正在进行内部装修，10 月开始招生。 4.环翠区东骏阅山幼儿园：主体已完工，正在进行内部装修，计划 2019 年招生。

1	市区年内计划建设 中小学10所、普惠 性幼儿园8所	市教育局	各区政府（ 管 委）	(三) 主体完工2所。 5.环翠区明辰幼儿园：主体建设已完工，内部尚未装修，园内场地尚未平整硬化。 6.环翠区张村中心幼儿园：主体建设已完工，内部尚未装修，园内场地尚未平整硬化。 (四) 正在建设1所。 7.高区高新教育幼儿园：完成进度20%，年底具备使用条件。 (五) 尚未开工1所。 8.环翠区环发幼儿园：将于9月开工建设，年底具备使用条件
2	推行家庭医生签约 服务，城乡居民签约 服务率分别达到 30%和65%以上	市卫生计 生委		1.孙家疃社区卫生服务中心共组建家庭医生服务团队5支，服务区域居民为城镇人口，共计18823人，签约5665人（1.0版4121人，2.0版1534人），签约率30.1%（计划目标30%）。 2.羊亭中心卫生院共组建家庭医生服务团队10支，服务区域居民为农村人口，共计30244万人，签约19659人（1.0版15878人，2.0版3781人），签约率65%（计划目标65%）

3	市区年内计划实施7条瓶颈路打通工程,治理“背街小巷”14处	市住房城乡建设局	各区政府(管委)	一、瓶颈路打通工程建设情况: (一) 已完工 1 处。 1.环翠区望岛河南路项目: 项目已完工。 (二) 正在建设 6 处。 2.高区奈古山路: 路面为土路, 目前仅有部分水泥、管道进场。 3.高区崇文路: 部分路面开挖, 正在铺设管道。 4.市直金线顶路: 现场正在施工, 地基下控完成。 5.市直渔港路项目: 部分地基下控完成, 正在施工。 6.经区齐鲁大道: 正在下控地基, 预计 12 月份完工。 7.经区新港路南延工程: 基本完工, 路表未整治铺设, 但路面情况较好。 二、治理“背街小巷”情况: (一) 已完工 9 处。 1.高区火炬三街: 已完工, 已启用通车。 2.高区火炬四街: 已完工, 正在施工划交通标线。 3.高区火炬八街: 已完工, 道路中线未划。 4.经区和盛巷: 已完成, 路面齐整。 5.经区凤林路北: 已完成, 路面齐整, 修整两侧设施。 6.经区东海路无名路: 已完工, 仅对两侧环境进行整治, 路况整体情况较好。 7.经区蒿泊大街农业银行西胡同: 已完工, 仅对乱贴乱挂、乱堆乱放等不文明行为进行清理, 对部分破损路面进行“打补丁”式修补, 路况较差。 8.经区峰北路西侧小巷: 已完工, 仅对乱贴乱挂、乱堆乱放等不文明行为进行清理, 现场路面未修整。 9.经区皇冠西路: 已完工, 仅对乱贴乱挂、乱堆乱放等不文明行为进行清理, 人行道破损严重。 (二) 正在建设 2 处。 10.环翠区苏州街背街小巷: 正在开挖路面。 11.环翠区菊花顶路背街小巷: 正在铺设路面、路牙石, 约 20 天完工。 (三) 尚未开工 3 处。 12.高区德州中街: 已完成方案、施工图设计, 招标控制价的编制工作, 计划 9 月中下旬开工, 11 月上旬完工
---	-------------------------------	----------	----------	---

5	市区年内计划建设小游园23个、山体公园5处,新增城市绿道18条、48.8公里,方便群众就近健身休闲。	市住房城乡建设局	市规划局、体育局、环翠区政府,高新区、经开区、临港区管委	4.高区宫松岭路小游园:已完工,地面有垃圾,环境卫生较差。 5.高区泰乐家园小游园:已完工,位于泰乐家园小区门口绿化带,内有部分凳子等休息设施。 6.高区欧乐坊小游园:已完工,依托世昌大道绿化带,安装休息设施。 7.高区大连路游园:已完工,依托绿化带景观,新增休息设施等。 8.经区站前广场小游园:已完工,设置休息区、小水池等设施。 9.经区曲阜游园:已完工,绿化并设置休息设施。 10.经区新都游园:已完工,新建公厕,铺设路面,设置休息区、小广场。 11.经区齐鲁小广场:已完工,对部分绿地进行改造,铺设小路,设置健身器材,部分路面破损。 12.临港区创新经济产业园小游园:已完工,配备环形跑道、池塘、休息区等。 13.临港区嘉和社区游园:已完工,社区内建设足球场,进行河道两侧绿化。 14.临港区威海游园:已完工,属于威高集团水韵康桥房地产项目配套建设。 15.临港区303省道滨河游园:已完工,依托滨河建设,建设管道、绿化带。 16.临港区佳赛园小游园:已完工,园内添加健身器材,但路面有破损。 17.临港区荷山全民健身中心:已完工,设置有健身器材、小广场、儿童游乐设施、旱冰场、足球场、羽毛球场地,绿化较多。 18.临港区荷山城北游园:已完工,绿化较好,设置小广场。 19.临港区汪疃镇公园小游园:已完工,2017年开始建设,2018年铺设人造绿化带,新增健身器材等。 (二)正在建设4个。 20.望岛河小游园:现场正在铺设地基,11月完工。 21.海峰游园:正在施工中,完成60%,11月完工。 22.后峰西游园:正在施工喷漆,项目基本完工。 23.南大疃游园:基础建设完成,正在进行园内铺设等施工,12月完工。 二、山体公园建设情况: (一)已完工1处。 1.环翠区张村南山山体公园:2016年开始施工建设,2018年主要进行二期工程,已完工
---	--	----------	------------------------------	---

5	市区年内计划建设小游园23个、山体公园5处,新增城市绿道18条48.8公里,方便群众就近健身休闲。	市住房城乡建设局	市规划局、体育局、环翠区政府,高新区、临港区管委会	(二)尚未开工4处。 2.环翠区金线顶公园:完成规划选址、用地预审及可研报告书编制工作,正在报发改委批复立项,计划9月完成立项批复;因项目区域正在进行规划调整,待规划部门完成调整后,确定设计规模,再组织设计单位招标,计划2019年5月开工。 3.高区笔架山山体公园:目前高区财政部门完成招标控制价审核,计划9月完成招标,10月开工建设。 4.经区曲阜山体公园:正在进行方案设计,计划2019年3月开工。 5.经区摩天岭山体公园:正在进行方案设计,计划2019年3月开工。 三、城市绿道建设情况: (一)正在建设14条。 1.新城渠崖街绿道:正在挖土基,预计10月份完成。 2.新城磐鼎路绿道:正在铺装路面,已完成70%。 3.新城泊高线绿道:正在路基施工,涉及村庄征地,年内完工压力较大。 4.新城金鸡大道绿道:正在半幅施工,涉及征地、原料供应不及时等问题,年内完工压力较大。 5.新城北一路绿道:正在施工,需土方爆破,需在公安部门办理相关手续,年内完工压力较大。 6.新城北二路绿道:正在施工,需土方爆破,需在公安部门办理相关手续,年内完工压力较大。 7.新城海悦路绿道:路面铺装已完成,正在进行收尾工作。 8.新城松涧路绿道:正在铺设路面,基本完成。 9.新城逍遥社区周边绿道:正在基础施工,铺设管网。 10.新城寨北路绿道:向北需要挖山,向南需与管廊交叉施工,年内完工压力较大。 11.新城逍遥路绿道:已完成路基施工,预计10月完成半幅沥青施工并通车,计划12月完成绿道建设。 12.临港区嘉和路绿道:正在铺设人行彩砖路面和绿化带。 13.临港区鸿福路绿道:正在施工,铺设绿化带。 14.临港区202省道绿道:基本完成,正在进行收尾工作。 (二)尚未开工4处。 15.新城经五路绿道:沿线村庄拆迁未完成,计划9月开工建设,12月底完工
---	---	----------	---------------------------	---

5	市区年内计划建设小游园23个、山体公园5处,新增城市绿道18条48.8公里,方便群众就近健身休闲。	市住房城乡建设局	市规划局、体育局、环翠区政府,环翠区、经高区、临港区管委	16.新城湖东路南延绿道:因该项目为PPP项目,中建集团正在进行内部施工队伍确定,预计9月完成招标并开工建设,12月完工。 17.新城湖西路绿道:未开工,为经贸交流中心施工现场进出通道,需待交流中心完工后组织施工,预计年内无法完工。 18.经区鸣翠山绿道:位于摩天岭公园内,需随公园一同设计、建设。目前正在进行方案设计及完善,计划2019年3月开工
6	推动“厕所革命”,改造提升中心城区公共厕所23处。	市住房城乡建设局	各区市政府(管委)	(一) 已完工10处。 1.高区海水浴场1号至3号公厕:已完工,未启用。 2.高区海水浴场4号公厕:已完工并启用。 3.高区林海公园1号至5号公厕:已完工并投入使用,在原有公厕的基础上加设加热板。 4.高区劳动力市场中心公厕:已完工并投入使用。 (二) 正在建设8处。 5.环翠区政府广场公厕:正在施工,11月完工。 6.环翠区樱花园公厕:正在拆除原有部分设施,12月完工。 7.环翠区五交化公厕:原公厕已停用,施工期为3个月,11月完工。 8.环翠区市立医院和平路公厕:原公厕已停用,正在组织施工,12月完工。 9.环翠区新威路公厕:正在施工,11月完工。 10.高区帝王宫公厕:正在施工,水务集团正在铺设污水管道,12月完工。 11.临港区滨河湿地公厕A户:木制公厕1处,主体结构主体完工,12月完工。 12.临港区滨河湿地公厕C户:正在打基础,12月完工。 (三) 尚未开工5处。 13.经区九龙河公厕 14.高区西河北公厕 15.高区山大路公厕 16.高区西北山公厕 17.高区西北山9路终点站公厕

7	中心城区开通优化7条公交线路，提高换乘便利性。	交通运输局	市财政局、住房城乡建设局、规划设计局、刘公岛管委会，环翠区政府，高新区、经区管委	优化调整了25、103、106、113、117、K7路等6条公交线路；对28、30路等2条公交线路进行了优化整合；撤销了114路、加密了115路，增设了10路黄岛路支线、节假日广福寺公交旅游专线 (一) 正在建设9个。 1.寿山石文化博物馆：正在进行室内装修，展览架等已备好，9月中下旬完工。 2.海依达丝绵画艺术馆：基本完工，正在布置体验区。 3.威海非遗文化空间：采用“1+5+10”模式打造，项目较多，基本完工。 4.京剧博物馆：正在进行展厅布置，预计10月中旬开展。 5.佳润美术馆：大厅装修基本完成，个别地方修补，具备布展条件。 6.吉呈轩民间技艺馆：展馆主体装修基本完成。 7.富城乡情民俗馆：基本完成，预备打造戏台一座。 8.中国国家画院周韶华艺术研究所：展馆打造基本完工。 9.刘公岛艺术馆：目前正在安装展板，预计9月底完工
8	市区年内计划利用老建筑建设城市博物馆等公益文化空间8处，丰富群众文化体验。	市文化广电新闻出版局		(一) 已建成19个。 1.环翠区孙家疔北海福苑颐养中心居家服务部：建成并投入使用，具备日间照料、助餐等服务功能，居家服务能力有待加强。 2.环翠区祥福家（连锁）杏花村社区养老服务组织：建成并投入使用，具备日间照料、助餐等服务功能，居家服务能力有待加强。 3.环翠区沐浴阳光老年公寓居家养老服务部：依托沐浴阳光老年公寓，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员不足，居家服务能力有待加强。 4.环翠区文笔峰老年公寓居家养老服务部：依托文笔峰老年公寓，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员不足，居家服务能力有待加强。 5.环翠区祥福家（连锁）竹岛路社区老年人日间照料中心：建成并投入使用，具备日间照料、助餐等服务功能，服务能力较弱，居家服务能力有待加强。 6.环翠区温泉镇小庄村居家照料中心：使用小庄社区服务中心设施，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，仅对本村居民免费开展服务，不对外开展居家养老服务。 7.环翠区张村皂南台居家照料中心：使用皂南台社区服务中心设施，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，仅对本村居民免费开展服务，不对外开展居家养老服务
9	市区年内计划新建社区居家养老服务组织20个，打造15分钟社区养老服务圈。	市民政局		

9	市区内计划新建社区居家养老服务组织20个,打造15分钟社区养老服务圈。	市民政局	8.高区寨北社区养老服务中心（居家服务部）：使用寨北社区设施，具备日间照料、助餐等服务功能，居家养老服务没有完全展开。 9.高区亲情园社区养老服务中心（居家服务部）：使用东涝台社区便民服务中心设施，具备日间照料、助餐等服务功能，居家养老服务没有完全展开。 10.高区初村镇小馆社区养老服务中心（居家服务部）：使用小馆社区服务中心设施，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员较少，居家养老服务能力有待加强。 11.经区陆安社区养老服务中心：使用长峰广安社区设施，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员不足，居家养老服务能力有待加强。 12.经区祥福家海峰路社区养老服务中心：建成并投入使用，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员不足，居家养老服务能力有待加强。 13.经区锦宏社区养老服务中心：使用锦宏社区服务中心设施，开展居家养老服务，具备日间照料、老年大学等服务功能，不能提供助餐服务，居家养老服务能力有待加强。 14.经区凤林街道办事处托老服务中心：依托凤林老年公寓，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，仅对本村居民免费开展服务，不对外开展居家养老服务。 15.经区康悦园老年人日间照料中心：使用祥台社区服务中心设施，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员较少，居家养老服务能力有待加强。 16.经区爱家无忧社区养老服务中心：使用曲阜社区服务中心设施，开展居家养老服务，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员较少，居家养老服务能力有待加强。 17.临港区汪疃敬老院：依托汪疃敬老院，开展居家养老服务，但现场未挂牌，未见居家养老服务内容公示，居家养老服务没有完全展开。 18.临港区苟山镇敬老院（居家组织服务部）：依托苟山敬老院，开展居家养老服务，但现场未挂牌，未见居家养老服务内容公示，居家养老服务没有完全展开。 19.临港区上诚健康养老服务中心（嘉和社区养老服务中心）：使用嘉和社区服务中心设施，开展居家养老服务，但现场未挂牌，具备日间照料、助餐等服务功能，工作人员较少，居家养老服务能力有待加强。 （二）尚未开工1个。 20.环翠区祥福家戚东布社区居家养老服务组织，将于9月投入运营
---	-------------------------------------	------	---

10	市区年内计划实施农村饮水安全巩固提升工程,改善46个村的居民饮水条件。	市水利局	各区市政府(管委)	(一) 已建成 18 个。 1.环翠区张村镇东乔村:建设净化水室、安装净水装备,施工已完成,尚未启用。 2.环翠区张村镇福德庄村:建设净化水室、安装净水装备,施工已完成,尚未启用。 3.环翠区张村镇刘家疃村:建设净化水室、安装净水装备,已完工并启用,但存在漏水问题。 4.环翠区张村镇姜家疃村:建设净化水室、安装净水装备,已完工并启用,水泵故障正在维修。 5.经区桥头镇信河北村:村内管网改造,对接水务集团管网,已投入使用。 6.经区桥头镇北墩前村:安装净水装备,已完工并启用。 7.临港区汪疃镇王家产村:安装净水装备,已完工并启用,左侧取水口故障。 8.临港区汪疃镇前白鹿村:安装净水装备,已完工并启用,室内为砖砌地面,有落叶、灰尘,卫生较差。 9.临港区汪疃镇白鹿店子村:安装净水装备,已完工并启用,室内堆放杂物。 10.临港区汪疃镇白鹿屯村:安装净水装备,已完工并启用。室内放有电脑等物品,有霉味;干旱严重时水量无法保证。 11.临港区汪疃镇北大英村:基本情况:安装净水装备,已完工并启用。净水设备室隔壁间堆放杂物。 12.临港区汪疃镇东梁格村:安装净水装备,已完工并启用。净水设备室内潮湿有霉味,隔壁间堆放杂物。 13.临港区蒿山镇道北店村:安装净水装备,已完工并启用。 14.临港区蒿山镇新权村:安装净水装备,已完工并启用。净水设备室隔壁有煤炉,存放柴火、煤等。 15.临港区蒿山镇小黄村:安装净水装备,已完工并启用。 16.临港区蒿山镇杨家卧龙村:安装净水装备,已完工并启用。净水设备室内卫生一般。 17.临港区蒿山镇北申格村:安装净水装备,已完工并启用。 18.临港区蒿山镇东申格村:安装净水装备,已完工并启用。 (二) 正在建设 5 个。 19.经区泊于镇夏庄村:村内管网改造,对接水务集团管网,开始动工划线,1个月内完工。
----	-------------------------------------	------	-----------	---

10	市区年内计划实施农村饮水安全巩固提升工程,改善46个村的居民饮用水条件。	市水利局	各区市政府(管委会)	20.经区桥头镇姚家圈村:村内管网改造,原水井处安装压力罐,开始动工划线,1个月内完工。 21.经区桥头镇教里村:村内管网改造,对接水务集团管网,开始动工划线,1个月内完工。 22.桥头镇前宅库村:村内管网改造,正在进行主管道施工,半个月内存完工。 23.桥头镇碑鲁村:村内管网改造,主管道铺设完毕,正进行支线铺设,1个月内完工。 (三)尚未开工23个。 尚未开工的23个村,其中环翠区4个、经区8个、临港区11个,计划到9月底,完成其中7个村饮水安全巩固提升工程;11月底,再完成9个;12月底,完成剩余7个
11	市区年内计划新建农业社会化综合服务中心4处,为农户提供一站式、全链条服务。	市农业局	各区市政府(管委会)	(一)已完工2处。 1.汪疃农业综合服务中心:与临港区联合打造区、镇农业综合服务中心,大楼完成主体施工,进入装修阶段。 2.桥头农业综合服务中心:已完工并投入使用。 (二)尚未开工2处。 尚未开工2处(羊亭镇、初村镇),将于9月份开工建设,预计于10月份完工
12	改造农村供暖设施,实现农村公共场所清洁供暖全覆盖	市住房和城乡建设局	市农村供暖工作领导小组成员单位	目前,环翠区等5个区市实施方案已经正式印发,文登区等3个区市正在组织设备采购,计划9月份开工建设,10月份完工

2018年1—8月为民办实事项目目标任务计划进度表

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
1	新建改扩建中小学校26所、普惠性幼儿园17所，持续改善城乡办学条件。	市教育局	各区市政府（管委）	中小学建设： 1月—2月，累计开工13所； 3月，累计开工18所、主体完工7所； 4月—5月，累计主体完工10所； 6月，累计开工19所、主体完工12所； 7月，累计开工20所； 8月，累计开工22所、主体完工14所、具备使用条件4所； 9月，累计开工24所、主体完工15所、具备使用条件13所、投入使用5所； 10月—11月，累计开工25所、主体完工16所； 12月，累计开工26所、主体完工20所、具备使用条件17所、投入使用5所。 幼儿园建设： 1月，累计开工14所； 2—3月，累计主体完工8所； 4—5月，累计投入使用1所； 6月，累计开工15所、主体完工11所； 7月，累计开工17所、具备使用条件3所； 8月，累计主体完工12所、具备使用条件5所； 9月，累计主体完工13所、投入使用3所； 10月，累计主体完工15所； 11月，累计主体完工17所、具备使用条件6所； 12月，累计主体完工17所、具备使用条件17所、投入使用6所	中小学建设： 全年规划新建、改扩建中小学校26所，其中，环翠区5所，文登区2所，荣成市10所，乳山市4所，高区3所，经区2所。截至8月底，已累计开工22所，其中，环翠区4所，荣成市10所，乳山市3所，高区3所，经区2所；累计主体完工16所，其中，环翠区2所，荣成市8所，乳山市3所，高区2所，经区1所。 幼儿园建设： 全年规划新建、改扩建普惠性幼儿园17所，其中，环翠区6所、文登区3所、荣成市4所、乳山市2所、高区1所、经区1所。截至8月底，已全部开工建设；累计主体完工15所，其中环翠区5所，文登区3所，荣成市4所，乳山市2所，经区1所；累计具备使用条件7所，其中环翠区2所，文登区3所，荣成市2所；累计投入使用4所，其中环翠区2所，文登区1所

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
2	推行家庭医生签约服务，城乡居民签约服务率分别达到30%和65%以上。	市卫生计生委		1月，组织召开全市家庭医生签约服务启动会； 2—3月，筹备召开全市家庭医生签约服务现场观摩会； 4月，出台全市家庭医生签约服务市级奖励办法； 5月，家庭医生签约服务管理系统上线运行； 6月，出台全市家庭医生签约服务门诊慢性病管理办法； 7月，组织对全市家庭医生签约服务进展情况上半年考核； 8月，对全市家庭医生签约服务设备配置情况进行现场验收； 9—10月，对家庭医生签约服务相关经费进行分配拨付； 11月，组织对家庭医生签约服务满意度进行电话回访； 12月，组织对全市家庭医生签约服务进展情况上半年考核。	组织召开了全市家庭医生签约服务启动会；在第8个“世界家庭医生日”期间组织开展家庭医生签约服务宣传活动，共开展健康讲座、咨询活动等180余场，发放宣传材料6.09万份，播放宣传片及公益广告2100余次。下发了《关于做好全市家庭医生签约服务团队建设工作的通知》。目前，全市基层医疗卫生机构签约服务团队645个，签约团队人员人数3410人。出台了《威海市家庭医生签约服务奖励资金管理暂行办法》，在设备配置、团队配置、签约服务进展情况、群众满意度等方面进行量化考核。6月底组织召开了全市家庭医生签约服务现场推进会，采取现场观摩与集中座谈相结合，就工作进展情况进行了通报，对下一步工作进行了安排部署。将全市家庭医生签约服务门诊慢性病患者和老年人纳入威海市职工长期护理保险规定保障范畴，结合居家护理等相关政策，丰富完善家庭医生签约服务包，进一步完善了门诊慢性病等管理政策。家庭医生签约服务信息系统项目已进入招标采购流程。环翠区、荣成市均已开发了家医签约系统。 截至8月底，全市家庭医生签约服务共计100万人（1.0版79万人、2.0版21万人），其中，城市居民25.17万人（1.0版21.54万人、2.0版3.63万人），签约率24.51%；农村居民74.82万人（1.0版57.49万人、2.0版17.33万人），签约率46.68%

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
3	实施市区7条瓶颈路打通工程，治理“背街小巷”20处。	市住房城乡建设局	各区人民政府（管委）	瓶颈路： 1月，2个项目完成招标控制价申报； 2月，2个项目启动招标工作； 3月，2个项目完成招标工作，完善前期手续，新开工1个项目； 4月，新开工2个项目，全部项目完成图纸设计； 5月，新开工1个项目； 6月，全部项目完成招标工作； 7月，新开工1个项目； 8月，推进各区项目的施工建设； 9月，新开工2个项目； 10月，推进各区项目的施工建设； 11月，1个项目完工，其余项目有序推进； 12月，完工6个项目，剩余1个项目（跨年度工程）完成路基施工。 背街小巷： 1月，启动整治项目的方案设计； 2月，启动整治项目的图纸设计； 3月，启动项目的招标工作，新开工7个整治项目； 4月，完成5个项目的招标工作，新开工3个整治项目； 5月，完善建设手续，新开工5个整治项目； 6月，完成图纸设计，完成剩余项目的招标工作； 7月，新开工1个整治项目； 8月，完工2个整治项目； 9月，完工5个整治项目，新开工4个整治项目； 10月，有序推进项目整治； 11月，7个项目完工，其余项目有序推进； 12月，完成全部项目整治并坚持长效治理	瓶颈路： 全年计划实施7条瓶颈路打通工程，其中环翠区1条、高区2条、经区2条、市直2条。截至8月底，已完成全部开工建设。 背街小巷： 全年计划治理“背街小巷”20处，其中环翠区2处、高区5处、经区7处、文登区6处。截至7月底，已完成图纸设计及招标工作，已开工环翠区菊花顶生活区、苏州街，文登区兴隆街、昌山街、泽库街、宋家街，经区和盛巷、皇冠西路、东海路东无名路、蒿泊大街北农业银行西胡同、凤林路北、峰北路西侧小巷，高区火炬三街、火炬四街、火炬八街等17个整治项目

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
4	绿化整治河道35条，优化沿河生态环境。	市水利局	市住房城乡建设局、林业、各区（市）政府（管委）	1月，进一步完善绿化整治实施方案，完成绿化用地调地总量的30%； 2月，完成绿化用地调地总量的30%； 3月，完成绿化用地调地总量的40%，完成绿化整治工作总量的70%； 4—5月，分别完成7%的绿化整治工作； 6月，完成6%的绿化整治工作； 7月，对上半年完成的绿化苗木进行补栽； 8—9月，加强绿化苗木管理，提高苗木成活率； 10—11月，完成剩余10%的绿化整治工作； 12月，完成绿化整治验收工作	对31条流域面积50平方公里以上的河道及4条城郊河道实施绿化整治，其中环翠区3条（羊亭河、北上乔河、望岛河），文登区9条（旺疃河、杜营河、青龙河、张格河、东母猪河、林村北河、楚峴河、昌阳河、母猪河），荣成市6条（沽河、沽河东支、小落河、埠柳河、车道河、东仙河），乳山市12条（赤家口河、锯河、老清河、刘家乔河、午极河、夏村河、徐家河、正甲乔河、诸往河、黄垒河、乳山河、白沙滩河），高区3条（长乔河、钦村河、涝台河），经区3条（五渚河、石家河、九龙河），临港区2条（东母猪河、山马河），南海新区2条（母猪河、昌阳河）。截至8月底，河道疏浚及边坡修复加固等完成土石方量810万立方米，河道绿化项目整体进度73%

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
5	改造农村供暖设施281处，实现农村公共场所清洁供暖全覆盖。	市住房城乡建设局	市农村供暖工作领导小组成员单位	1月，开展摸底调查工作，组织赴外地考察学习； 2月，研究起草2018年工作实施方案； 3月，修改完善年度实施方案并印发实施； 4月，组织开展各项前期工作； 5月，农村幼儿园等公共场所及新型社区供暖设施安装陆续开始着手开工； 6月，农村幼儿园等公共场所及新型社区供暖设施安装开工一半以上； 7月，农村幼儿园等公共场所及新型社区供暖设施安装全面开工； 8月，供暖设施安装的工程量完成25%以上； 9月，供暖设施安装的工程量完成一半以上； 10月，供暖设施安装的工程量完成75%以上； 11月，农村幼儿园等公共场所及新型社区全部实现冬季清洁供暖； 12月，对供暖效果进行检查	组织赴济南、河北、天津、北京进行农村供暖调研，印发并组织实施《威海市2018年农村供暖工作实施方案》，督促、指导各区市按照《实施方案》开展农村供暖工作，目前，环翠区等5个区市实施方案已经正式印发，文登区等3个区市正在组织设备采购

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
6	建设小游园23处、山体公园5处，新增城市绿道48.8公里，方便群众就近健身休闲。	市住房城乡建设局	市规划局、体育局、环翠区政府，高新区、经港区、临港区管委	山体公园： (1) 张村南山山体公园：1—2月，开展施工方案及土石方调整工作；3月，开展绿化配套、管线安装及部分场地硬化；4月，开展塑胶场地、道路硬化、管线安装；5月，开展体育器材照明设施安装及收尾工作。6月，完工并向公众开放。 (2) 金线顶山体公园：2—5月，开展立项等工作，组织勘察设计方案设计工作；6月，完成立项等工作，进行方案设计；7—9月，开展方案设计工作；10月，确定设计方案；11—12月，进行施工图设计。2019年开始主体施工和苗木栽植，2020年进行基础配套设施施工和工程收尾工作，2020年12月底前完工并向公众开放。 (3) 曲阜山体公园：1—2月，开展山体公园范围摸底调查工作；3—4月份，开展征地、清表工作；5月，开展方案设计工作；6月，初步确定设计方案；7—8月，开展方案汇报及进一步完善工作；9月，出具施工图；10月，编制工程量清单及控制价；11月，发布招标公告；12月，组织开展招标投标工作，确定施工单位。预计2019年12月底前完工并向公众开放。 (4) 摩天岭山体公园：（计划安排同曲阜山体公园） (5) 笔架山公园：1—3月，进行项目确认、方案设计和方案完善工作；4月，完成施工图、工程造价、预算审核、前期招标手续；5月，完成施工招标；6月，开展场地垃圾清理、平整工作；7月，开展绿化地形调整、硬化地面夯实工作；8—12月，开展面层（含管线）施工及广场、停车场、球场等硬化施工。预计2019年12月底前完工并向公众开放。 小游园： 1—3月，完成小游园方案设计； 4—5月，完成施工招标； 6—7月，完成大规模苗木栽植； 8—10月，小游园项目基本完工，同时进行检查、评比。 城市绿道： 3月底前基本完成方案设计； 5月底前完成施工招标； 7月底前完成大规模苗木栽植； 11月底前基本完工	山体公园： 南山山体公园已完工并向公众开放；金线顶公园正在进行立项报批、组织设计单位招标等工作；曲阜公园、摩天岭公园正在进行方案设计；笔架山公园，现已完成施工图设计，正在进行招标前准备工作。 小游园： 经区曲阜游园等19个游园已完工；环翠区海峰游园等4个游园正在进行苗木栽植。 城市绿道： 全年计划新增城市绿道48.8公里，其中新城14条35.75公里，经区1条0.86公里、临港区3条12.222公里。截至8月底，新城金鸡大道、海安路、临港区嘉和路等14条、41.24公里城市绿道正在组织施工和进行苗木栽植。其余4条、7.56公里分别为，经区鸣翠山0.86公里绿道将随摩天岭公园项目一同实施，预计年内难以开工；新城湖西路2.4公里，因道路贯穿国际经贸交流中心场区范围并毗邻主体建筑，需经贸中心主体完工后进行道路施工，预计年内难以开工；新城湖东路南延2.5公里绿道为PPP项目，中建集团正在确定施工队，预计9月完成招投标，12月完工；经五路1.8公里绿道正在进行村庄拆迁工作，预计9月开工，12月完工

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
7	推动“厕所革命”，改造提升中心城区公共厕所25处，完成农村改厕11.3万户。	市住房城乡建设局	各区市政府（管委会）	公共厕所： 1月，启动选址、调研等工作； 2月，启动22个项目施工图设计，2个项目施工招标； 3月，18个项目确定设计方案； 4月，5个项目确定设计方案，2个项目启动施工； 5月，完善相关手续办理，启动招标工作并完成18个项目的招标工作； 6月，全部项目完成招标工作，启动18个项目的施工建设； 7月，启动5个项目的施工建设； 8月，有序推进各区项目的施工建设； 9月，2个项目完成施工； 10月，10个项目完成施工，6个项目投入使用； 11月，1个项目完成施工，4个项目投入使用； 12月，全部项目完成施工并投入使用。 农村改厕： 1—3月，完成招投标等前期工作； 4—6月，改造50%； 7—9月，改造75%； 10—12月，完成年度改造任务，年底前实现全覆盖。	公共厕所： 全年计划改造提升中心城区公共厕所25处，其中环翠区4处、高区16处、经区1处、临港区2处、文登区2处。截至8月底，已开工19处，环翠区改建4处公厕已开工建设；高区开工建设公厕12处，海水浴场等10处公厕已主体完工，帝王宫公厕等2处公厕进入施工阶段；临港区新建2处公厕，已进入施工阶段；文登区新建2处公厕中，世纪大道公厕已完工；昆嵛路抱龙河公厕因规划选址变更，计划9月10日开工。 农村改厕： 全年计划完成农村改厕11.3万户，其中文登区28000户、荣成市5418户、乳山市79696户。截至8月底，改造农村厕所8.4万户，完成年度计划的74.3%
8	中心城区开通优化7条公交线路，提高换乘便利性。	市交通运输局		1月，开展客流调查； 2月，制定年度城区线路优化方案； 3月，制定年度城郊线路优化方案； 4月，调整1条公交线路； 5月，开通1条线路； 6月，调整1条线路； 7月，开通1条线路； 8月，调整1条线路； 9月，调整1条线路； 10月，调整1条线路	截至8月底，完成了28、41、37等18条线路的公交客流调查，制定了城区11条线路优化方案，城郊7条线路优化方案；编制了威海站公交线路运营组织方案，计划将9条线路延伸至威海站，4条线路首发站调整至威海站；组织开展了东部滨海新城区域公交线路网布设情况调查；制定了张村镇至高区公交线路开通方案。 优化调整了25、103、106、113、117、K7路等6条公交线路；对28、30路等2条公交线路进行了优化整合；撤销了114路、加密了115路，增设了10路黄岛路支线、节假日广福寺公交旅游专线、19路威海海洋公园支线

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
9	利用老建筑建设城市博物馆等公益文化空间8处，丰富群众文化体验。	市文化广电新闻出版局	市财政局、住房城乡建设局、规划局、刘公岛管委会，环翠区政府，高新区管委会	1月，召开工作协调会，落实工作任务，走访驻威部队协商老洋房利用工作； 2月，开展选址工作，和部队沟通材料上报工作； 3月，走访北海舰队和北部战区协商老洋房的保护利用事宜； 4月，确定公益文化空间展示内容，制定设计方案； 5月，出台资金扶持等鼓励性文件； 6月，启动展示建设工程，做好安防、消防施工等工作； 7—9月，督导建设工程进度，组织专家进行指导； 10月，对达到条件的公益文化空间进行验收； 11月，全面完成公益文化空间建设及验收工作	全年计划利用老建筑建设城市博物馆等公益文化空间8处，其中，环翠区3处，高新区、经区各2处，刘公岛1处。 截至8月底，已完成9处空间（含1处备选空间）选址和展陈方案设计，制定并出台了相关资金扶持鼓励性文件，正在组织开展施工建设，并组织专家进行业务指导
10	新建社区居家养老服务组织72个，打造15分钟社区养老服务圈。	市民政局		1—2月份，将此项工作列入全市目标绩效考核，下达各区市建设目标。切块下达中央试点财政支持居家和社区养老服务改革试点资金。 3—4月份，综合考虑基础较好的养老服务机构、社区日间照料设施，统筹安排建设居家养老服务组织。确定中央财政拟补助的居家养老服务组织，签订服务协议，下达补助资金。 5—10月份，督导各区市加快居家养老服务组织培育，已建成的要发挥功能，承接政府购买居家养老服务等工作。 11—12月份，制定居家养老服务组织星级管理标准，开展等级评定工作，对实施效果好的居家养老服务组织，颁发星级牌匾	制定居家养老服务组织考核细则，下达各区市建设任务，其中环翠区8个、文登区15个、荣成市22个、乳山市15个、高新区3个、经区6个、临港区3个，同时将中央试点资金下达各区市，扶持居家养老服务组织培育。 通过发动社会力量注册居家养老服务组织或企业，选择基础较好的养老服务机构、社区日间照料设施增加居家养老服务项目等方式，统筹安排建设居家养老服务组织，截至8月底，已投入运营居家养老服务组织50个。其中，环翠区8个，文登区12个，荣成市10个，乳山市8个，高新区3个，经区6个，临港区3个

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
11	实施农村饮水安全巩固提升工程，改善252个村的居民饮水条件。	市水利局	各区市政府（管委会）	1月，开展摸底调查，制定实施计划； 2月，制定详细建设内容； 3月，开展工程测量、现场勘查等前期工作； 4月，充分听取各方面意见，进行必要的方案比较和技术论证； 5月，完成年度实施方案编制工作； 6月，组织施工建设，计划完成总进度的20%； 7月，开展督导检查，查看工程施工情况，总进度达到35%； 8月，总进度达到50%； 9月，总进度达到65%； 10月，召开专题会议，加快推进全市农村饮水安全工作，总进度达到75%； 11月，总进度达到85%； 12月，全面完成农村饮水安全巩固提升工程建设任务，改善252个村的居民饮水条件	全市共计划对252个村实施农村饮水安全巩固提升工程。涉及环翠区8个村；文登区53个村；荣成市90个村；乳山市63个村；经区15个村；临港区23个村。截至8月底，已完成119个村施工建设，占总计划的47.2%，其中环翠区4个村，文登区27个村，荣成市46个村，乳山市25个村，经区5个村，临港区12个村

序号	目标任务	牵头单位	责任单位	工作计划	进展情况
12	新建农业社会化综合服务中心31处，为农户提供一站式、全链条服务。	市农业局	各区市政府（管委）	1月，分解工作任务，调度区市社会化综合服务中心名单； 2月，开展农业社会化服务调查摸底，督导工作开展，累计建成农业社会化综合服务中心3处； 3月，制定农业社会化服务中心建设考核办法，累计建成农业社会化综合服务中心6处； 4月，调度农业社会化服务中心建设及工作情况，累计建成农业社会化综合服务中心7处； 5月，组织开展农业社会化服务中心服务调研，督导工作开展，累计建成农业社会化综合服务中心10处； 6月，完成半年调度考核，累计建成农业社会化综合服务中心15处； 7—8月，调度农业社会化服务中心建设及工作情况，累计建成农业社会化综合服务中心25处； 9月，组织召开农业社会化服务观摩会，累计建成农业社会化综合服务中心27处； 10—11月，调度农业社会化服务中心建设及工作情况； 12月，完成全年工作考核，累计建成农业社会化综合服务中心31处	全市建设镇级社会化综合服务中心31处，其中文登区、荣成市、乳山市各9处，环翠区、高区、经区、临港区各1处。 截至8月底，全市共建成农业社会化服务中心25处，其中，文登区8处，荣成市6处，乳山市9处，经区、临港区各1处；共配备专职人员92人，开展土地全托管8850亩、土地半托管104702亩，完成土地整理42246亩，引导土地流转48009亩
